



Herramientas de implementación: Proyecto de implementación

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Este tema trata sobre el proyecto de implementación de una nueva instalación de SAP Business One.

Objetivos




Objetivos:

- Explicar las ventajas de la metodología de un proyecto
- Indicar las actividades clave en un proyecto de implementación
- Describir las herramientas y plantillas proporcionadas con la metodología AIP de SAP
- Utilizar y personalizar planes de proyecto integrados en SAP Business One

Al finalizar este tema, podrá:

- Explicar las ventajas de la metodología de un proyecto
- Indicar las actividades clave en un proyecto de implementación
- Describir las herramientas y plantillas proporcionadas con la metodología AIP de SAP
- Utilizar y personalizar planes de proyecto integrados en SAP Business One

Ejemplo empresarial



Es más que simplemente instalar el software. .

Una implementación de SAP Business One satisfactoria implica una buena planificación y ejecución

¿Cómo pasa de un contrato de ventas con una lista de los requisitos de los clientes a un caso exitoso?



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


3

- Es más que simplemente instalar el software. . . De hecho, por lo general, esta parte es la más fácil de la implementación.
- Como consultor de implementación, habitualmente está involucrado en el fin del ciclo de ventas. Por lo tanto, es importante que el equipo de ventas le proporcione al cliente un contexto exhaustivo, incluidos los objetivos del cliente, las preocupaciones y los procesos empresariales generales.
- SAP proporciona muchos recursos para ayudarlo, incluida una metodología estructurada para implementaciones. Esta metodología se basa en las experiencias prácticas de SAP y numerosos interlocutores de implementación. En esta metodología encontrará planes de proyecto, así como herramientas y documentos que le ayudarán a tener éxito.

Cuestionario

¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación? Revise la lista e identifique una o más estrategias que utilizaría para aumentar las probabilidades de éxito.

- ☐ Aprovechar la experiencia de SAP
- ☐ Aprovechar la experiencia de otros interlocutores
- ☐ Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias
- ☐ Definir y gestionar las expectativas del cliente
- ☐ Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto
- ☐ Contar con un proceso de gestión de cambios
- ☐ Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto
- ☐ Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

4

¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación?

Deténgase unos momentos para revisar la lista e identifique una o más estrategias que utilizaría para aumentar las probabilidades de éxito.


Elegiría:

- ☐ ¿Aprovechar la experiencia de SAP?
- ☐ ¿Aprovechar la experiencia de otros interlocutores?
- ☐ ¿Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias?
- ☐ ¿Definir y gestionar las expectativas del cliente?
- ☐ ¿Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto?
- ☐ ¿Contar con un proceso de gestión de cambios?
- ☐ ¿Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto?
- ☐ ¿Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto?

Cuestionario

¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación?

- ☑ Aprovechar la experiencia de SAP
- ☑ Aprovechar la experiencia de otros interlocutores
- ☑ Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias
- ☑ Definir y gestionar las expectativas del cliente
- ☑ Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto
- ☑ Contar con un proceso de gestión de cambios
- ☑ Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto
- ☑ Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

5

- Todas las estrategias marcadas mejorarán el éxito de un proyecto de implementación.

Rol del consultor de implementación: responsabilidades



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

Un proyecto de implementación necesita un rango variado de conocimientos además de conocimientos del producto:

- Gestión de proyectos y la gestión de relaciones con los clientes y expectativas
- Formación de usuarios finales
- Análisis y asignación de los procesos empresariales del cliente para una solución
- Identificación y alcance del software e informes del cliente
- Conocimientos técnicos como la migración de datos existentes y la instalación de SAP Business One en la infraestructura del sistema
- Configuración de los procesos empresariales (ventas, compras, logística, finanzas, informes, etc.) y configuración en SAP Business One

¿Cuál considera como la parte más difícil del trabajo de consultor de implementación?

Los interlocutores existentes nos informan que las tareas más difíciles en la implementación están relacionadas con **el análisis de los procesos empresariales del cliente y su asignación a una configuración de SAP Business One.**

Asimismo, la migración de datos es, por lo general, una tarea difícil para los interlocutores ya que es necesario tener conocimiento sobre las tablas de bases de datos y con frecuencia los datos del cliente no se asignan con facilidad a SAP Business One. Generalmente, la migración de datos tarda más de lo esperado.

No subestime el tiempo necesario para recopilar y analizar las necesidades empresariales de clientes. Dedique el tiempo suficiente durante el proceso de ventas y durante la implementación de esas tareas.

Recursos

Recursos específicos de interlocutor

SAP PartnerEdge

- Información, formación y activos p. el proc. previo a la venta, ventas, implementación y soporte
- Superusuarios necesarios

Experto de producto local

- Soporte y formación en todo el país
- Aspectos de localización

Support Launchpad

- Interfaz primaria para ofrecer soporte a los clientes
- Descarga de software
- Solicitud de licencia



Partner Services Advisor

- Punto de contacto para una asociación contractual con SAP y onboarding
- Sesiones para expertos

Fuentes de información general

Centro de aprendizaje

- Caminos de aprendizaje (formación autoguiada para usted y sus clientes)
- Superusuario no necesario

SAP Community

- Foros para preguntas sobre implementación
- Blogs
- Superusuario no necesario

Portal de ayuda

- Guías y hojas de ruta del producto
- Superusuario no necesario


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

7

SAP proporciona varios recursos para ayudarle. Van contra el sentido de las agujas del reloj e incluyen:

- El portal PartnerEdge (en <https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/implement.html>) es una fuente de información para consultores. Debe tener un ID de usuario (número de superusuario), que le autoriza a utilizar la mayoría de los servicios del portal. Cada consultor debería obtener un ID de usuario personal. Si es un interlocutor nuevo en SAP y su organización ha firmado un acuerdo de interlocutor con SAP, puede solicitar un ID de usuario en PartnerEdge.
- La mayoría de los países cuenta con un experto de producto local que es experto en los productos y las necesidades de SAP Business One en su localización. El LPE puede ofrecerle asistencia con los problemas de localización.
- El Support Launchpad (<https://launchpad.support.sap.com/>) es la interfaz primaria para ofrecer soporte a los clientes después de haber empezado a utilizar el programa. También puede descargar el software desde este sitio, y solicitar claves de licencia para los usuarios. También puede acceder al launchpad desde PartnerEdge.
- Una organización de Partner Service Advisory (PSA) le proporciona un único punto de contacto para cuestiones contractuales y relacionadas con la asociación y para onboarding. PSA también facilita sesiones de activación productivas y registradas en una variedad de temas.
- El portal de ayuda es una fuente única para documentación, como las guías, las novedades, las hojas de ruta del producto, los gráficos de licencia, etc. Visite help.sap.com y busque SAP Business One. Este sitio también está disponible para sus clientes.
- La comunidad de SAP (<https://www.sap.com/community>) es una fuente para blogs y preguntas y respuestas sobre la implementación y temas técnicos. También puede hacer preguntas o escribir un blog.
- El centro de aprendizaje publica formaciones autoguiadas (con casos de estudio, simulaciones y evaluaciones) en SAP Business One. Tanto a usted como sus clientes pueden acceder a la formación de forma gratuita. Es necesario registrarse. Para registrarse o iniciar sesión, vaya a <https://training.sap.com/businessone>.

Roles y responsabilidades del equipo del proyecto

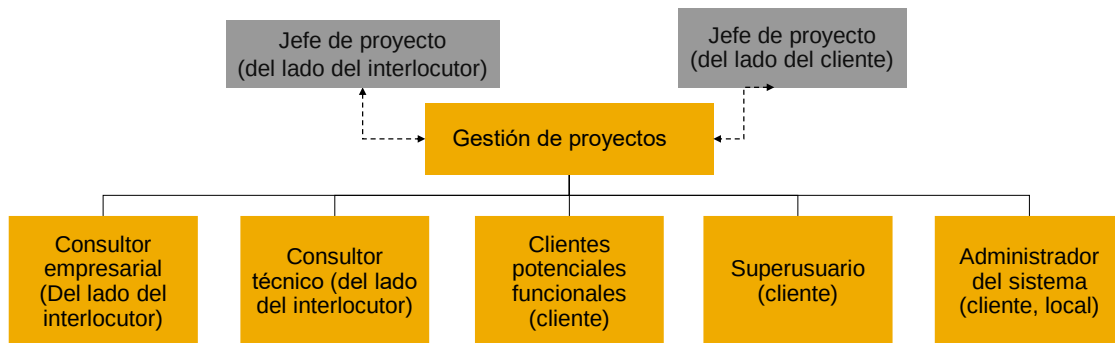

Un proyecto empresarial pequeño típico requiere tanto un gestor de proyectos del lado del interlocutor y un jefe de proyectos del lado del cliente.

También del lado del interlocutor las tareas se pueden dividir entre un consultor empresarial y un consultor técnico:

- El consultor empresarial lleva a cabo talleres de procesos empresariales y produce el blueprint empresarial
- El consultor técnico instala y configura el sistema sobre el blueprint empresarial.
- Los dos roles los puede ejecutar una misma persona o varias personas


En el lado del cliente, además del jefe de proyectos, son necesarios los siguientes roles para el proyecto:

- Un cliente potencial funcional que representa cada área, como ventas, compras, contabilidad, almacén, etc. Los clientes potenciales funcionales deben asistir a los talleres de proceso empresarial y también llevar a cabo la prueba de los procesos empresariales que controlan
- El cliente debe asignar un superusuario Esta persona será formada para realizar funciones administrativas en el nuevo sistema de producción, como la creación de usuarios y la configuración de autorizaciones. Esta persona recibirá formación en todas las áreas de SAP Business One.
- Un responsable técnico del cliente debe formar parte del equipo del proyecto (para sistemas locales).

Metodología



Metodología de implementación

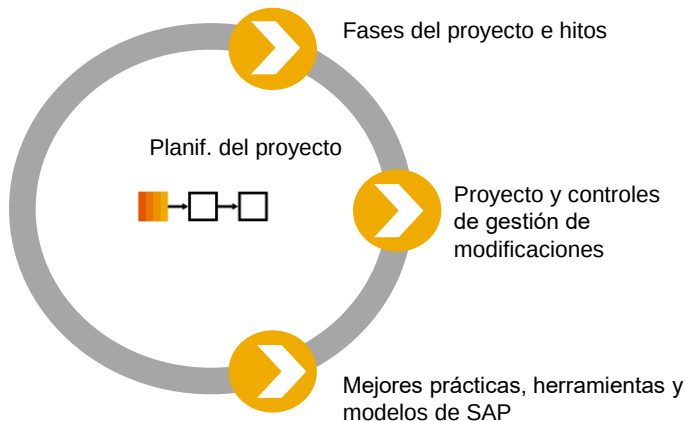

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

Valor empresarial:

- Estructura de proyecto demostrada con fases e hitos formales
- Añade la gestión de modificaciones y controles de gestión de proyectos

Metodología de AIP:

- Se recomienda para las implementaciones de SAP Business One ya que se basa en las experiencias prácticas de SAP y numerosos interlocutores.
- Proporciona herramientas y plantillas para el análisis de procesos empresariales, el blueprint empresarial, la migración de datos, etc.
- Descargar desde PartnerEdge

10

La metodología es más que simplemente una planificación del proyecto. Le proporciona una estructura al proyecto añadiendo fases formales con hitos que deben lograrse antes de que el proyecto pueda avanzar. Aplica la gestión de proyectos y controles de gestión de modificaciones a un proyecto.


Su organización de interlocutor puede tener su propia metodología. Si es así, debe aprender la metodología y herramientas que utiliza su empresa.

SAP recomienda la metodología de implementación acelerada (AIP, Accelerated Implementation Program) para las implementaciones de SAP Business One, tal y como se ha diseñado específicamente para pequeñas instalaciones empresariales (local y en la nube) y se basa en experiencias prácticas de SAP y muchos interlocutores.

La metodología AIP contiene mejores prácticas, guías, herramientas y modelos. La metodología y los materiales están disponibles para la descarga desde SAP PartnerEdge. Todas las herramientas y modelos se suministran en formato Microsoft Word o Excel y puede modificarlos según sus propios requisitos. Puede decidir si utilizar toda o parte de la metodología.

Fases de metodología de implementación AIP

- Especialmente diseñada para implementaciones de SAP Business One
- Divide una implementación en cinco fases:

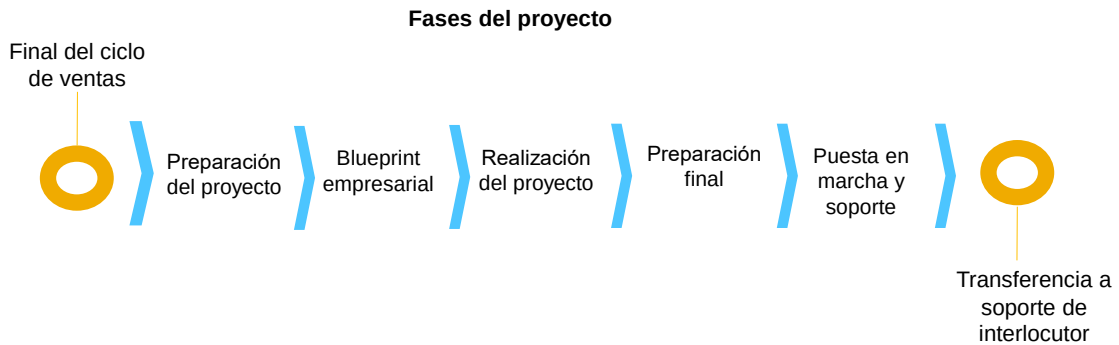


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

- La metodología AIP divide un proyecto de implementación en cinco fases. Estas fases incluyen el período que comienza con la *transferencia por parte del equipo de ventas* hasta la *transferencia a la organización de soporte de interlocutor*. Las fases son las siguientes:
 1. Preparación del proyecto. Prepárese para el proyecto de implementación con la planificación inicial con el equipo de ventas.
 2. Blueprint empresarial. Análisis y asignación de procesos empresariales.
 3. Realización del proyecto. Configuración y personalización de la base de datos de la empresa del cliente.
 4. Preparación final. Prepárese para la puesta en marcha.
 5. Puesta en marcha y soporte. Asegúrese de que el nuevo sistema del cliente funcione según lo previsto en el período predefinido antes de transferir el cliente a su equipo de soporte.

Actividades clave por fase de un vistazo

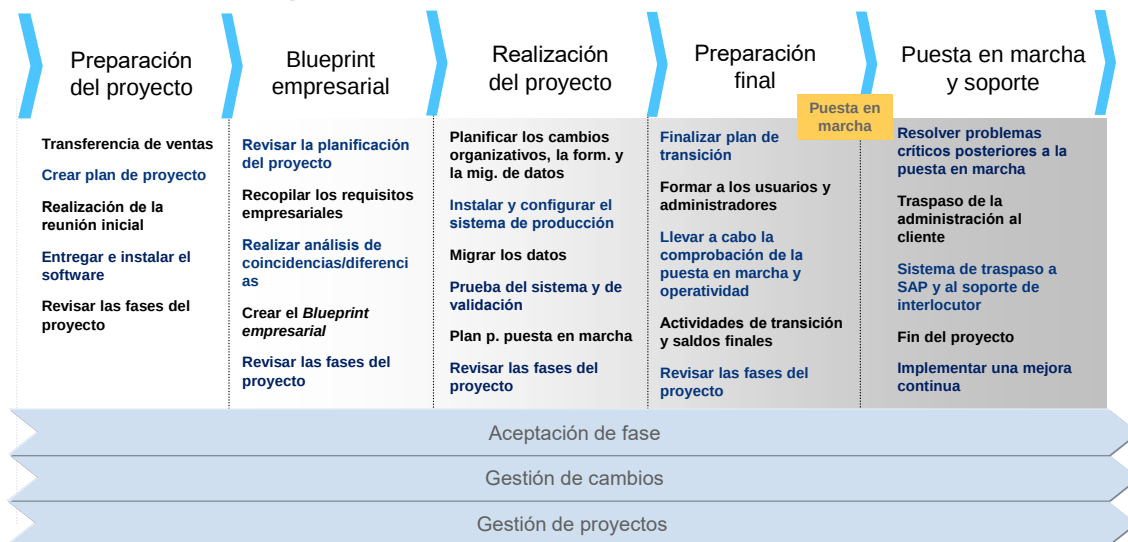

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

12

La metodología combina las actividades clave en una fase con la gestión de proyectos y modificaciones.

- **Preparación del proyecto:** El objetivo consiste en proporcionar una transición suave del ciclo de ventas. Es posible que el equipo de implementación no haya participado en el ciclo de ventas, por eso es importante tener una transferencia detallada de ventas. El otro objetivo es crear una relación con el cliente. El entregable más importante es el software: el software de SAP Business One se entrega e instala, lo que marca el inicio contractual del proyecto.
- **Blueprint empresarial:** El objetivo es la asignación de una solución para ejecutar los procesos empresariales del cliente. Puede resultar extraño encontrar aquí la asignación de procesos empresariales (¿no se realizó durante el ciclo de ventas?). Lo que tiene lugar en esta fase es un análisis detallado de cada uno de los procesos empresariales del cliente y de cómo se configurarán en el nuevo sistema. Esto podría requerir la personalización para satisfacer cualquier disparidad. El entregable principal es el blueprint empresarial, la hoja de ruta de la fase siguiente. El blueprint empresarial documenta la configuración del sistema para dar soporte a los procesos empresariales.
- **Realización del proyecto:** El sistema está configurado y los datos del sistema existente del cliente se migran. Esto permite la prueba y validación utilizando los datos propios del cliente. Durante esta fase debe planificar para la siguiente etapa: analizar la necesidad de formación y valorar si el cliente está listo para realizar el despliegue de producción.
- **Preparación final:** Los usuarios finales están formados y se decide realizar la puesta en marcha. Una verificación de disponibilidad debe contener una lista de criterios que se deben cumplir antes de la puesta en marcha. Los usuarios finales deben estar completamente formados, el hardware y de una infraestructura listos y los procedimientos documentados operativos, etc. Justo antes del cambio a producción, se migran los datos finales, incluidos los saldos actuales para el libro mayor y los saldos pendientes de cliente y proveedor.
- **Puesta en marcha y soporte:** supervise el nuevo sistema y resuelva problemas críticos relacionados con la implementación antes de "transferir" oficialmente el cliente a su equipo de soporte.

Preparación del proyecto Hitos de la fase

Preparación del proyecto

Transferencia de ventas

Crear plan de proyecto

Realización de la reunión inicial

Entregar e instalar el software

Revisar las fases del proyecto

Hitos:

- Plan de proyecto revisado y acordado por cliente
- El software instalado para el cliente (idealmente con la base de datos de muestra)
- Cierre oficial de la fase por parte del cliente

Herramientas y modelos:

Mejores prácticas:



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

Tiempo 13

Veamos las fases individuales de forma más detallada.

En la preparación del proyecto, las **actividades** clave para un consultor de implementación sirven para:

- Realizar la transferencia con el equipo de ventas
- Crear un plan de proyecto de implementación
- Asistir a la reunión inicial (que debería estar organizada por el equipo de ventas).
- Instalar el software de SAP Business One (idealmente con la base de datos de muestra)

Nota: El jefe de proyecto del cliente y otros miembros principales del equipo del cliente deberían haber sido convocados durante el ciclo de ventas. El equipo de ventas tiene responsabilidad de garantizar que el cliente ha suministrado personal al equipo del proyecto y que el proyecto cuenta con el soporte del propietario o patrocinador de la empresa.

Los **hitos** que puede utilizar para medir el éxito de esta fase son:

- Plan de proyecto revisado y acordado por cliente
- El software instalado en el cliente
- Cierre oficial de esta fase por parte del cliente. El cierre significa que el cliente está de acuerdo con el plan de proyecto y el programa.

Prep. del proyecto Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

14


Las **mejores prácticas** de SAP recomendadas para esta fase son:

- Reunirse con el equipo de ventas *antes* de la reunión inicial para comprender los procesos, objetivos, preocupaciones, necesidades únicas, riesgos o restricciones del cliente (incluidos los riesgos de modificaciones importantes en el futuro o una temporada alta que podrían poner en peligro el proyecto). Debería garantizar que las expectativas del cliente definidas durante el proceso de ventas sean factibles y de que se hayan comunicado correctamente las características del producto y no se hayan exagerado.
- Evaluar el hardware y la infraestructura en el cliente: Esto incluye el servidor (local) y la red y la infraestructura de escritorio. Si esto se hace con antelación, habrá tiempo suficiente para solicitar actualizaciones.
- Realice una demostración de SAP Business One en la reunión inicial utilizando la base de datos de muestra: se recomienda introducir el cliente a SAP Business One lo antes posible. Incluso puede crear datos maestros y documentos en la base de datos de muestra del cliente utilizando los interlocutores comerciales y productos del cliente. Al realizar una demostración del producto le proporciona al equipo del cliente una comprensión visual y la oportunidad de realizar las primeras preguntas.
- Comunique con claridad el tiempo y el esfuerzo que necesite por parte del equipo del cliente. Con frecuencia, a las pequeñas empresas les cuesta suministrar personal para trabajar en proyectos, pero esto es necesario para el éxito del proyecto, por lo que este tema debería abordarse en la reunión inicial. Debería asignarse un cliente potencial funcional en cada área empresarial (ventas, compras, contabilidad, etc.).

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:

- La transferencia de lista de verificación de ventas y de análisis empresarial de preventas para documentar los objetivos y requisitos del cliente
- Recibo de entrega de software para documentar la entrega del software
- Aceptación de la fase para reconocer la terminación de la fase
- La hoja de cálculo del análisis y riesgos de la fase del proyecto para evaluar y calcular el riesgo del proyecto, en función de las respuestas que proporcione.

Blueprint empresarial Hitos de la fase

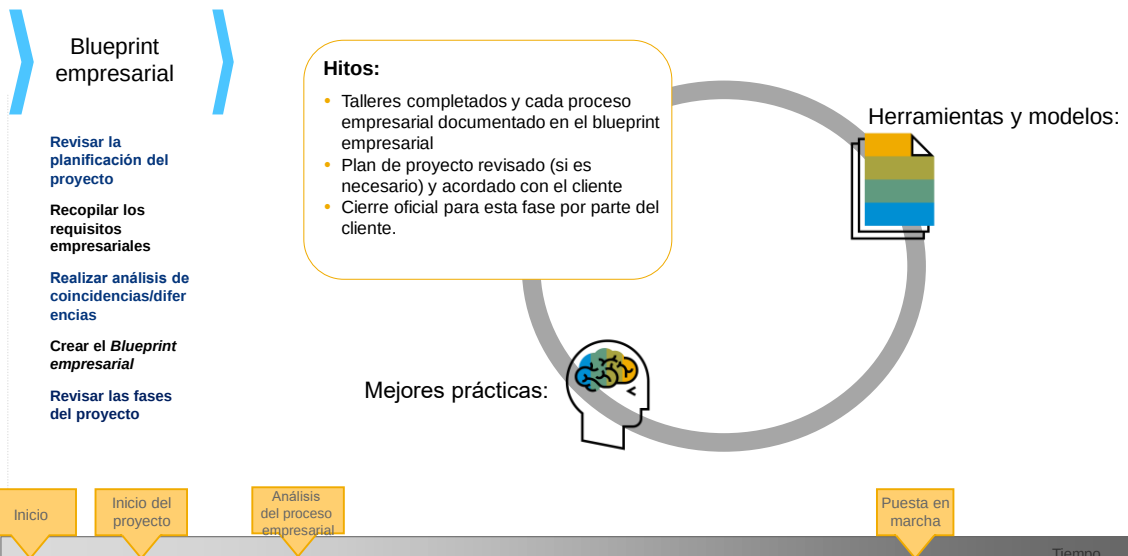

El **blueprint empresarial** se centra en un análisis detallado de los procesos empresariales y necesidades del cliente. Sus actividades son:

- Realizar workshops de recopilación de requisitos del proceso empresarial
- Trazar los procesos hasta obtener una solución e identificar cualquier disparidad
- Completar un blueprint empresarial, que documenta cómo se configurará el sistema


SAP recomienda realizar talleres de recopilación de requisitos según el proceso, por ejemplo:

- Ventas
- Compras
- Gestión de stock
- Producción y MRP
- Finanzas y contabilidad
- Servicio
- Gestión de bancos

Puesto que cada cliente es diferente, es posible que desee organizar talleres de otra forma. Recuerde que debe incluir datos maestros e informes en cada taller. El cliente potencial funcional del área empresarial debería asistir taller relevante junto con alguien de contabilidad. En el taller debería solicitar a los clientes potenciales funcionales que describan sus procesos y operaciones existentes. Puede demostrar estos procesos en el sistema. Los **hitos** para esta fase son:

- Talleres de procesos empresariales completados y documentados en el blueprint empresarial
- Plan de proyecto revisado (si es necesario) y acordado con el cliente
- Cierre oficial de esta fase por parte del cliente.

Blueprint empresarial Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase

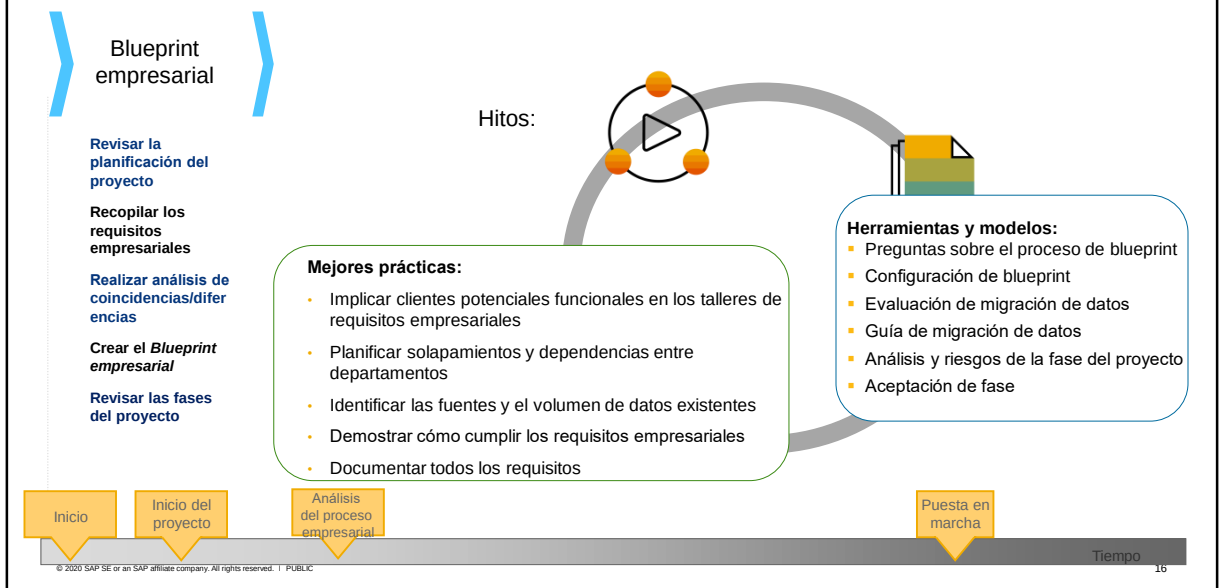

Las **mejores prácticas** de SAP recomendadas para esta fase son:

- Realizar talleres con los clientes potenciales funcionales del cliente de cada área o departamento empresarial. En estos workshops debe analizar detalladamente los pasos de cada proceso del cliente. Además de los procesos más importantes como ventas, compras y servicios, debe incluir los procesos financieros y de gestión de informes.
- Al programar las diferentes talleres, planifique solapamientos y dependencias entre departamentos.
- Durante los talleres debe identificar las fuentes y el volumen de los datos existentes que debe migrar.
- Utilice SAP Business One durante los talleres para demostrar cómo el sistema puede hacer frente a las necesidades empresariales.
- Documente todos los requisitos en el blueprint empresarial y asegúrese de que el cliente comprende que este es el alcance del proyecto

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:

- Preguntas sobre el proceso de blueprint
- Configuración de blueprint
- Evaluación de migración de datos
- Guía de migración de datos
- Aceptación de fase
- Análisis y riesgos de la fase del proyecto para revisar la fase y evaluar la evolución del proyecto y si se ha producido algún riesgo

Preguntas sobre el proceso de blueprint

Contents

1. Introduction	
1.1. Purpose	
1.2. Blueprint Configuration	
1.3. Related Documents	
2. Blueprint Process Questions	
2.1. Bookkeeping Master Data Management	
2.2. Journal Entry Posting and Analysis	
2.3. Payments (Incoming and Outgoing)	
2.4. Bank Statement Processing and Reconciliation	
2.5. Budget Management and Analysis	
2.6. Cost Accounting Management and Analysis	
2.7. Cash Management	
2.8. Inventory	
2.9. Production Administration and Analysis	
2.10. MRP	
2.11. Service Administration and Analysis	
2.12. Human Resources Management	

- Lista de preguntas genéricas para cada proceso empresarial
- Utilizar durante los talleres de recopilación de requisitos para determinar los detalles de cada proceso empresarial de cliente

Configuración de blueprint

Blueprint Configuration

1. Introduction	
2. Company Creation	
3. Company Details	
3.1. General	
3.2. Basic Initialization	
3.3. Accounting and Tax Data	
4. General Settings	
5. Document Settings	
5.1. General	
5.2. Per Document Settings	
5.3. Document Numbering	
5.4. Predefined Text	
6. Alerts	
8.5. Projects	
8.6. Tax Codes	
8.7. Withholding tax	
8.8. Recurring Postings	
8.9. Transaction Templates	
9. Banking	
9.1. Bank Information	
9.2. Bank Charge Allocation codes	
9.3. Payment Methods	
9.4. Payment Run Defaults	
10. Inventory	

- Documento maestro para la configuración y los cambios de configuración necesarios en SAP Business One para implementar cada proceso empresarial

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

Las preguntas sobre el proceso de blueprint y la configuración de blueprint son documentos de implementación clave para SAP Business One.


De la misma forma que los documentos AIP, se proporcionan como modelos y puede editarlos, ampliarlos y configurarlos para su uso.

Estos dos documentos funcionan juntos:

- Utilice las preguntas de proceso empresarial durante los talleres de recopilación de requisitos para determinar los detalles de cada proceso del cliente. Asegúrese de añadir preguntas adicionales para cubrir procesos ampliados que no se mencionan en la lista.
- Utilice la información reunida desde las preguntas detalladas para documentar la configuración y parametrizaciones de sistema necesarias en el documento de configuración de blueprint. Indicar la configuración y las modificaciones de la configuración necesarias para implementar el proceso empresarial. Puede utilizar el documento de blueprint como lista de verificación al realizar la configuración y los cambios de configuración en la base de datos de la empresa. Al final del proyecto, proporcione una copia de este documento completo para su organización de soporte.

En la lista aparecen preguntas para cada proceso empresarial. Intente usar la terminología del cliente, no terminología de SAP Business One.

Debe registrar la configuración y los cambios de configuración necesarios para cada proceso.

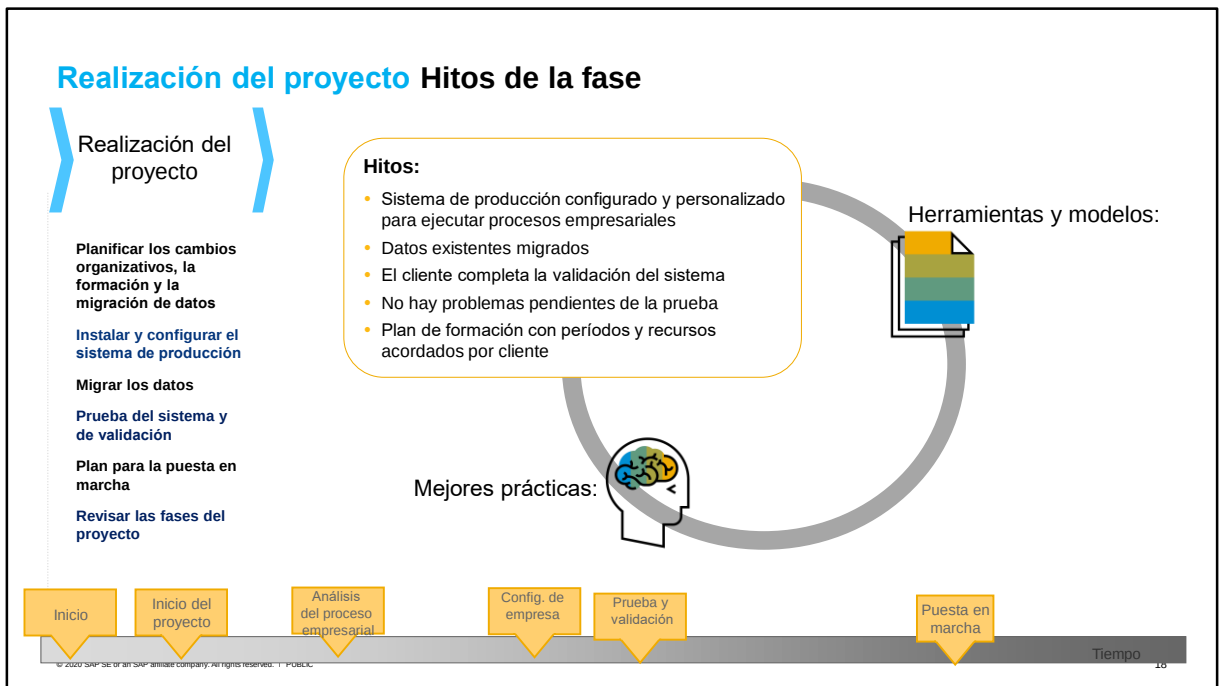


La **realización del proyecto** es el núcleo del proyecto. Los **hitos** para esta fase son:

- Sistema de producción configurado y personalizado para ejecutar procesos empresariales. Cuando se haya completado la configuración, debe realizar una copia de la base de datos de producción que se pueden utilizar para realizar pruebas y formación.
- Datos existentes migrados
- El cliente completa la validación del sistema. Debe planificar cuidadosamente los casos de prueba con el cliente. Los casos de prueba no deben tratar solo el proceso empresarial dentro de SAP Business One, si no el proceso global que incluyen interfaces de sistemas externos. El cliente debe asegurarse de que los planes de prueba abarquen todos los casos de prueba. Los casos de prueba suministrados con AIP se pueden utilizar como base para desarrollar procedimientos para realizar pruebas del sistema.
- No hay problemas pendientes de la prueba
- Plan de formación con períodos y recursos acordados por cliente. Durante esta fase, el consultor debe *planificar* la formación de los usuarios finales. La formación se realizará en la siguiente fase, pero es recomendable que obtenga un compromiso del cliente para conocer la disponibilidad de los usuarios para participar en la formación. La formación podría ser entregada por el consultor o por el cliente, en función de lo que determine el contrato. La guía de formación en los materiales de AIP ofrece sugerencias y directrices para la formación del usuario final.

Nota: Puede que sea necesaria la gestión de cambios durante esta fase, ya que muchos usuarios utilizar el sistema por primera vez y es posible que se vuelvan a asignar los roles o responsabilidades.

Realización del proy. Modelos, herramientas y mejores prácticas de la fase

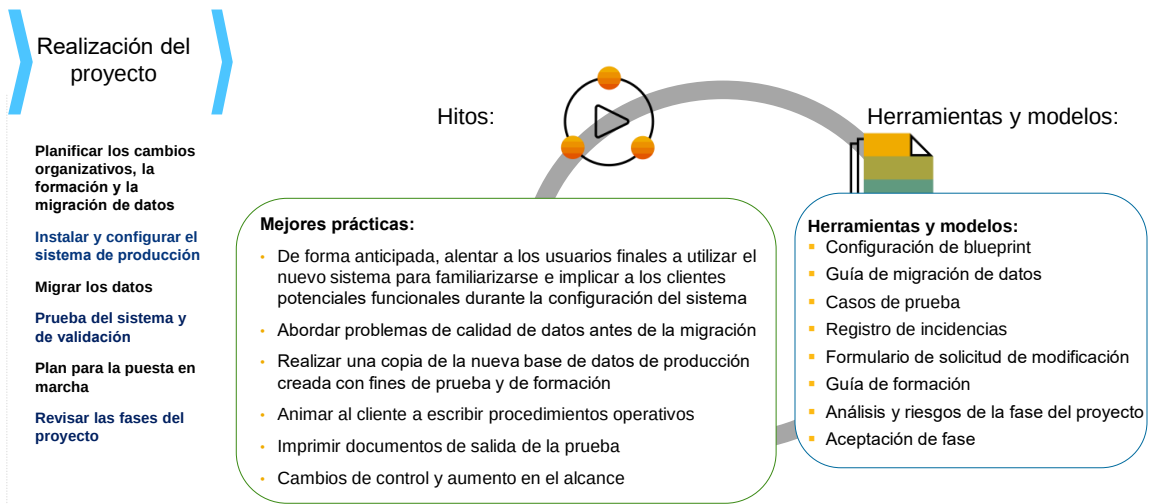

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

Las mejores prácticas son:

- De forma anticipada, alentar a los usuarios finales a iniciar sesión en el nuevo sistema y practicar el funcionamiento para obtener un nivel de comodidad. Implicar a los clientes potenciales funcionales durante la configuración del nuevo sistema para que se sientan como parte del proceso.
- Abordar el problema de la calidad e integridad de datos con el cliente. A menos que se acuerde lo contrario, es generalmente responsabilidad del cliente "depurar" los datos existentes antes de la migración, y el consultor sólo es responsable de la migración real.
- Después de que haya configurado el sistema de producción, realice una copia de la base de datos y usar esta copia para la validación del sistema, las pruebas del sistema y para la formación.
- Aliente al cliente a crear procedimientos operativos ahora. Es mucho más fácil crear éstos al mismo tiempo que se validan los procesos empresariales. Y éstos también pueden usarse y probarse durante las pruebas del sistema.
- Imprimir una copia de todos los documentos de salida, como facturas, pedidos de cliente, informes, etc., y balances contables y obtener la autorización del cliente tras la aceptación.
- Durante la validación de cliente existe la posibilidad de cambios en el alcance. Asegúrese de documentar todas las modificaciones solicitadas y analizar con el cliente cualquier impacto en el alcance y los costes del proyecto. El plan del proyecto debe actualizarse para reflejar los cambios del alcance o la línea de tiempo.

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:

- Guía de migración de datos y configuración de blueprint de la fase anterior
- Casos de prueba
- Registro de incidencias
- Formulario de solicitud de modificación
- Guía de formación
- Fase de cierre y análisis y riesgos de la fase del proyecto

Guía de migración de datos

Table of Contents

1. Introduction
2. Assessing the Data Migration Scope
 - 2.1. Consistent Documents
 - 2.1.1. Data Migration Assessment
 - 2.1.2. Migration Object List Worksheet
3. Cleansing and Transforming Legacy Data
 - 3.1. Data Cleansing
 - 3.2. Data Transformation
 - 3.3. Tools

- Enfoque estructurado a la migración de datos durante un proyecto de implementación e instrucciones paso a paso para los saldos de apertura

6.4. Items and Item Prices

Z. Item Quantities and Costs

- 7.1. Options for Migration of Item Quantities and Costs
- 7.2. Inventory Opening Balances Transaction
 - 7.2.1. Perpetual Inventory
- 7.3. Data Transfer Workbench – Stocktaking Template
 - 7.3.1. Step 1 – Stock Taking
 - 7.3.2. Step 2 – Stock Posting
- 7.4. Goods Receipt w/o PO
 - 7.4.1. Data Transfer Workbench – Goods Receipt w/o PO
 - 7.4.2. Manual Goods Receipt w/o PO
 - 7.4.3. Perpetual Inventory

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

Análisis y riesgos de la fase del proyecto

TOPIC	TASKS	ANSW. (YES/NO)	COMMENTS	RISK LEVEL (1 to 10)
Project Meetings	Project meeting structure			
	1. Partner Internal (Partner Project Manager – Consultants)	F (H)		F (H)
	2. Project Managers (Customer – Partner)	F (H)		F (H)
	3. Project Teams (Customer – Partner)	F (H)		F (H)
	4. Steering Committee (Customer – Partner)	F (H)		F (H)
Business Processes Configuration	Business Process verification			
	1. Were the processes configured according to the Blueprint signed by the customer?	F (H)		F (H)
	2. Were the configured processes (prototypes) without			
Test Activities	Unit Test activities (Test system)			
	1. Were proper test cases provided to the users?	F (H)		F (H)
	2. Has the test been executed with real master and balance data?	F (H)		F (H)
	3. Did users complete the test cases using data from real documents?	F (H)		F (H)
	4. Were the issues reported by users documented?	F (H)		F (H)
Risk Assessment	5. Did the partner correct the issues that were reported?	F (H)		F (H)
Risk Assessment P. Preparation Blueprint P. Realization F. Preparation Go Live & Support Balance				

- Preguntas para evaluar los riesgos del proyecto

La guía de migración de datos le proporciona una guía paso a paso para importar datos existentes, incluida una orden recomendada para la migración de datos y saldos de apertura.

La hoja de cálculo de análisis y riesgos de la fase del proyecto contiene preguntas para evaluar el riesgo del proyecto durante cada fase del proyecto de implementación. Puede evaluar riesgo global mediante la introducción de los posibles riesgos en cada pregunta.

Preparación final Hitos de la fase

Preparación final

Finalizar plan de transición

Formar a los usuarios y administradores

Llevar a cabo la comprobación de la puesta en marcha y operatividad

Actividades de transición y saldos finales


Revisar las fases del proyecto

Hitos:

- Usuarios finales formados que pueden utilizar el sistema para realizar sus trabajos
- Se confirma la disponibilidad del sistema para la entrada en productivo
- Actividades de transición completadas
- Aceptación de la fase

Herramientas y modelos:

Mejores prácticas:



El objetivo de la preparación final es llevar el nuevo sistema configurado, junto con la infraestructura y los usuarios, al punto en el que pueda pasar a utilizarse en producción. Esta fase finaliza con el paso a la producción desde el sistema existente a SAP Business One.

Los **hitos** son:

- Usuarios finales formados que pueden utilizar el sistema para realizar sus trabajos
- La disponibilidad del sistema de "puesta en marcha" se confirma y se acuerda una fecha de puesta en marcha con el cliente. La verificación de disponibilidad debe incluir criterios que se deben cumplir antes de la puesta en marcha. Todos los problemas críticos pendientes deben resolverse, el hardware y la infraestructura deben estar listos y los procedimientos operativos documentados.
- Actividades de transición completadas antes de pasar a la producción. El período de transición antecede a la puesta en marcha, momento en que numerosas actividades deben producirse en la secuencia correcta y en un periodo de tiempo muy breve de modo que el nuevo sistema pueda ejecutar completamente el trabajo de producción. Las actividades incluyen:
 - Suspensión del sistema existente
 - Migración datos maestros, cantidades finales de artículos del recuento de inventario, operaciones abiertas, como los pedidos o pedidos de cliente, y cuentas de balance de última hora. Vea el tema *Saldos de apertura* en esta formación para obtener más detalles.
 - Reconciliación de la contabilidad entre el sistema existente y el nuevo
- El cliente acepta la fase

Preparación final Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase

Preparación final

Finalizar plan de transición

Formar a los usuarios y administradores

Llevar a cabo la comprobación de la puesta en marcha y operatividad

Actividades de transición y saldos finales

Revisar las fases del proyecto

Hitos:

Mejores prácticas:

- Adaptar diapositivas proporcionadas por SAP para la formación del usuario
- Permitir que cada usuario tenga acceso práctico durante la formación
- Consultar el plan de proyecto de AIP y otros materiales de AIP para actividades de transición, criterios de disponibilidad del sistema y pasos de migración del saldo de apertura
- Realizar actividades de transición a lo largo del fin de semana
- Garantizar que el cliente acepta la fase

Herramientas y modelos:

- Guía de migración de datos
- Guía de formación
- Análisis y riesgos de la fase del proyecto
- Aceptación de fase


Las mejores prácticas son:

- Utilizar y adaptar las diapositivas proporcionadas por SAP para la formación de usuarios finales (las diapositivas se podrán descargar desde PartnerEdge).
- Durante la formación, permitir que los usuarios trabajen de forma individual en el sistema SAP Business One. Es imprescindible que los usuarios finales estén totalmente preparados para utilizar el nuevo sistema. Incluso si no impartiera la formación, tiene que evaluar que los usuarios estén preparados.
- Las actividades de transición se documentan en el plan del proyecto de AIP.
- Las sugerencias para la verificación de la operatividad del sistema se documentan en la hoja de cálculo de análisis y riesgos del proyecto en los materiales de AIP.
- Consultar la guía de migración de datos para obtener instrucciones paso a paso para la migración del saldo de apertura.
- Programar actividades de transición durante un fin de semana o durante algún otro período tranquilo.
- Garantizar que el cliente acepta esta importante fase ya que la aceptación compromete al cliente con la fecha de puesta en marcha.

Las herramientas y modelos que puede mejorar son:

- Guía de migración de datos
- Guía de formación
- Aceptación de fase
- Análisis y riesgos de la fase del proyecto

Puesta en marcha y sop. Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase



Puesta en
marcha y
soporte

Resolver problemas
críticos posteriores a la
puesta en marcha

Traspaso de la
administración al
cliente

Sistema de traspaso a
SAP y al soporte de
interlocutor

Fin del proyecto

Implementar una mejora
continua

Hitos:



Herramientas y modelos:



Mejores prácticas:



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

Tiempo 23

- **Puesta en marcha y soporte** es la fase final del proyecto. Como su nombre indica, el nuevo sistema creado ya está funcionando en producción. Soporte en este contexto significa que puede resolver los problemas relacionados con el nuevo sistema para un período de tiempo que debe especificarse en el contrato.
- Cuando se resuelven todos los problemas críticos, el equipo de implementación “transfiere” el sistema al equipo del cliente, al equipo de soporte del interlocutor y a SAP. Asegúrese de que el administrador de TI del cliente está formado y de que puede ofrecer soporte al sistema en las operaciones. Además, su propio departamento de soporte debe estar preparado para ofrecer soporte al nuevo cliente.
- En lo que concierne a AIP, este es el cierre del proyecto. El cliente acepta el sistema en producción firmando el formulario de aceptación de la fase.

Las mejores prácticas incluyen:

- Proporcionar personal de soporte con el blueprint empresarial y cualquier otra documentación del proyecto.
- Involucrar al responsable de cuentas de SAP Business One y al comité directivo del cliente (si corresponde) en el cierre del proyecto
- Programar una conferencia de optimización y revisión de cuatro a seis semanas después de la reunión de cierre del proyecto. Esta operación le ofrece la oportunidad de evaluar el rendimiento del sistema y planificar ampliaciones adicionales.

Resumen de herramientas y modelos de AIP

	Preventa / Preparación del proyecto	Blueprint empresarial	Realización del proyecto	Preparación final	Puesta en marcha y soporte
Proceso empresarial Análisis	- Análisis de preventa - Transferencia de ventas	- Preguntas sobre el proceso del plano empresarial - Herramienta BPML - Guía de usuario de BPML	Guía de migración de datos	Guía de migración de datos	
Configuración / Infraestructura / Pruebas	Recibo de entrega de software	- Configuración de plano empresarial - Evaluación de migración de datos - Guía de migración de datos	- Configuración de plano empresarial - Lista de objetos de migración - Herramienta BPML - Guía de estrategia para pruebas - Casos de prueba		
Gestión de proyectos	- Presentación de reunión de inicio - Acuerdo de nivel de servicio	- Guía de formación - Formulario de solicitud de cambio	- Formulario de solicitud de cambio - Plan de formación por rol - Guía de formación - Registro de problemas y cambios	Plan de formación por rol	
	- Planificación del proyecto - Agenda de reunión - Acta de reunión - Herramienta de análisis de fase y riesgos - Aceptación de fase				

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

24


- Los materiales de AIP se muestran aquí organizados de acuerdo con cada fase y por finalidad:
 - Las herramientas y los modelos del Análisis de procesos empresariales** se proporcionan para determinar el alcance y recopilar datos antes de la implementación y para reunir requisitos de procesos empresariales detallados y de migración de datos. La Guía de migración de datos ofrece un método paso a paso sobre la migración de datos y supone una buena referencia para introducir saldos de apertura.
 - Se proporcionan **herramientas y modelos de configuración, infraestructura y prueba** para registrar la transferencia del software al cliente y para documentar la organización y configuración. Se proporciona la herramienta de hoja de cálculo de seguimiento para la migración de objetos. En una hoja de cálculo se proporcionan casos de prueba de muestra, junto con una guía sobre Estrategias de prueba.
 - Las herramientas y modelos de gestión de proyectos** incluyen un modelo en PowerPoint para la reunión inicial con el cliente y un Acuerdo del nivel de servicio (SLA) de muestra. Puede utilizar la Guía de formación como referencia para planificar la formación durante la implementación. También se proporciona el formulario de Solicitud de cambio y un registro de cambios/problemas para gestionar los problemas a lo largo de la implementación. La herramienta final que vale la pena mencionar es el formulario Aceptación de la fase. Utilícelo para que el cliente acepte un entregable clave o fase con el fin de realizar un seguimiento del proyecto.
 - La hoja de cálculo *Evaluación de riesgos* es una herramienta que calcula automáticamente las estimaciones de riesgo del proyecto, en función de las respuestas que proporcione.

Planificación del proyecto



Plan de proyecto con metodología AIP - Integrado

Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de implementación

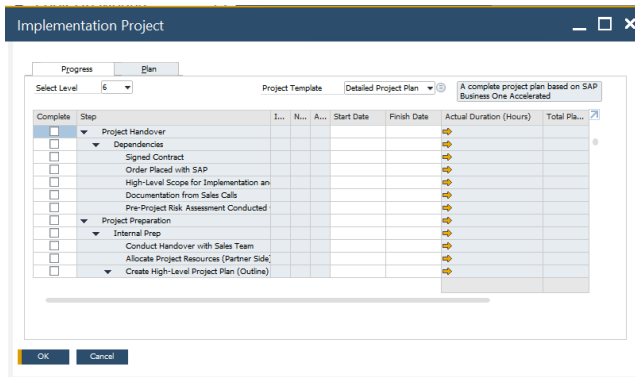

- Plan de proyecto completo para una implementación de SAP Business One, alineada a la metodología AIP
- Local o nube
- Contiene tareas detalladas para todas las fases de AIP, se puede visualizar en 6 niveles de granularidad
- Traducido al idioma de la localización
- Durante un proyecto de implementación, los miembros del equipo del proyecto pueden compartir el plan para:
 - Adjuntar documentos del proyecto
 - Registrar tiempos reales y plazos de la tarea


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

26

- Se proporciona un plan de proyecto de implementación con los materiales de AIP. También puede encontrar este plan integrado en la aplicación de cliente SAP Business One con las herramientas del Centro de implementación.
- El plan está totalmente alineado con las fases de AIP y se puede utilizar en despliegues en la nube o locales.
- Puede ampliar y ver las tareas en seis niveles de granularidad diferentes.
- Muchos socios encontrarán el plan integrado más fácil de utilizar y además ofrece varias ventajas. Debido a que forma parte de la aplicación de cliente, se traduce al idioma de la localización y los usuarios del equipo de proyecto, incluyendo los clientes, pueden acceder fácilmente a él. Y puede adjuntar y compartir documentos de proyecto y registrar el tiempo planificado y el tiempo real de una tarea o fase.

Modelos de plan del proyecto

Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de implementación

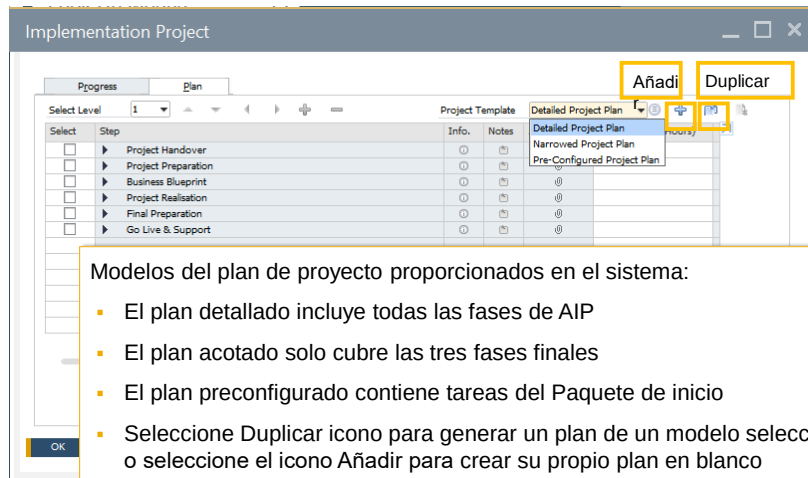

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

27

- Se proporcionan tres planes de proyecto diferentes:
 - Plan de proyecto detallado. Este plan contiene tareas para las cinco fases definidas en la metodología del Programa de implementación acelerada (AIP) de SAP.
 - Plan de proyecto acotado. Este plan contiene tareas para solo las fases Realización del proyecto, Preparación final y Puesta en marcha de la metodología Programa de implementación acelerada. Esto resulta útil para un interlocutor de solo implementación.
 - Plan de proyecto preconfigurado. Este plan contiene las tareas necesarias para gestionar una implementación basada en el paquete de inicio de SAP Business One.
- Los planes de proyecto se han diseñado para utilizarse como modelos: abra un modelo de plan y seleccione el icono modelo Duplicar para generar un nuevo plan que pueda editar. El nuevo plan tiene todas las tareas del modelo.
- También puede seleccionar el icono de añadir para crear un plan nuevo y vacío y configurar sus propias tareas.

Tareas de planificación

- En la ficha **Plan**, puede:
- Introducir estimaciones para una tarea o (en horas). Los tiempos incluyen hasta la tarea y fase del nivel superior
- Añadir información, notas y adjuntar documentos a una tarea o fase

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

28

Existen dos fichas en el plan del proyecto: progreso y plan.


En la ficha Plan, puede calcular el tiempo teórico en horas de una tarea o fase en cualquier nivel. Los tiempos abarcan hasta la tarea de nivel superior.

También puede añadir información, notas y adjuntar documentos a una tarea. Por ejemplo, puede añadir el documento de transferencia de ventas AIP a la tarea de preparación del proyecto, o el documento de blueprint empresarial a la tarea de blueprint empresarial.

Cuando añade información, notas o documentos, el icono gris pasa a ser azul.

Nota: Para grabar un documento como adjunto a un plan de proyecto, debe definir la vía de acceso a una carpeta de adjuntos del proyecto. Esto no está definido en las parametrizaciones generales, pero se lleva a cabo en *Parametrizaciones de vía de acceso* del centro de implementación. El documento que busca se copiará en esta carpeta para poder utilizarlo en el plan del proyecto.

Gestionar el progreso del proyecto

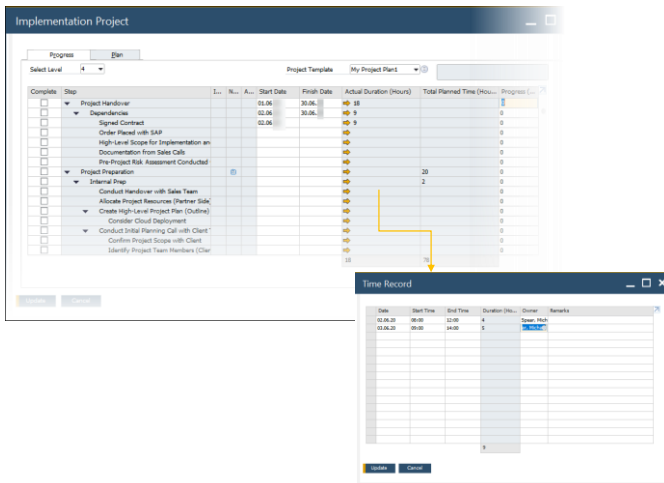


- La gestión del progreso del proyecto se lleva a cabo en la ficha **Progreso**
- Puede introducir las fechas de inicio y fin de una tarea y registrar el tiempo real empleado en una tarea en el registro de tiempos
- Al introducir el tiempo debe seleccionar un propietario (los datos maestros de empleado son necesarios)

En la ficha Progreso, puede introducir las fechas de inicio y fin estimadas para una tarea y registrar el tiempo real dedicado a una tarea. Para introducir el tiempo, haga clic en la flecha naranja de la columna *Duración real* para abrir la ventana Registro de tiempo.

Tenga en cuenta que se requiere el nombre del propietario cuando registre el tiempo. El propietario debe tener un registro de datos maestros de empleado, pero no necesita una cuenta de usuario. El tiempo se registra en la columna Duración real y abarca hasta una tarea de nivel superior.

El progreso hasta la fecha se calcula y aparece en la columna % del progreso.


Integración de las tareas con pantallas de configuración

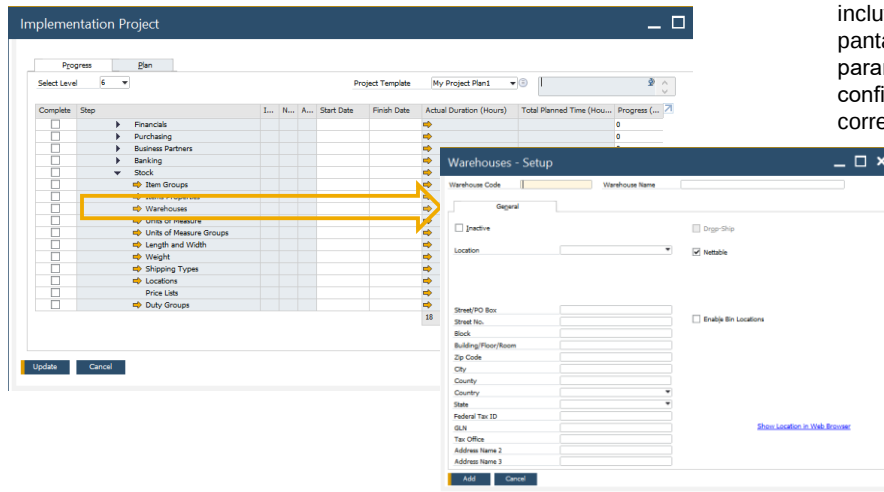


- Las tareas del proyecto incluyen enlaces con pantallas de parametrización y configuración correspondientes

- Las tareas del proyecto contienen enlaces directos con las pantallas de parametrización y configuración correspondientes de SAP Business One.
- En el ejemplo mostrado, cuando selecciona la flecha de enlace para la tarea “Establecer almacenes”, la ventana de configuración correspondiente se abre automáticamente.
- Como puede imaginar, esto puede acelerar el tiempo de trabajo de un consultor al compartir y configurar las parametrizaciones con el cliente. Una vez finalizada la parametrización, el consultor puede marcar la casilla de selección de tarea completa para indicar que la configuración ha sido completada.

Cómo añadir y retirar tareas

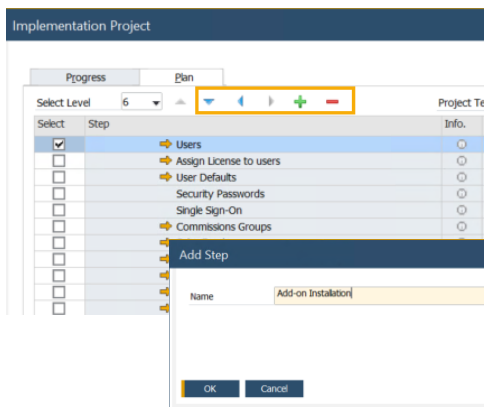

- Para añadir o retirar una tarea, seleccione una tarea y, a continuación, seleccione el icono + o – para añadir una nueva tarea después de la tarea seleccionada, o retirar la tarea seleccionada
- Para mover una tarea o desplazarse a un nivel diferente, seleccione una de las flechas

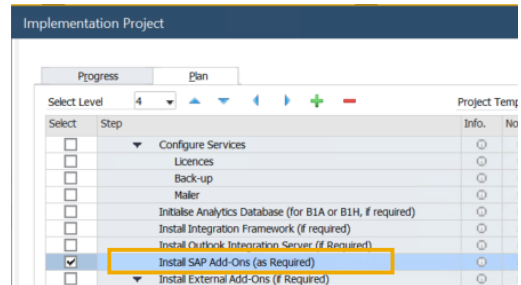

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

31

- Para añadir una nueva tarea, seleccione una tarea y utilice el icono de más. La nueva tarea se añadirá después de la tarea seleccionada.
- Puede mover cualquier tarea a una nueva ubicación marcándola y utilizando los iconos de flecha de arriba y abajo.
- Puede modificar el nivel y sangría de cualquier tarea mediante los iconos de flecha de izquierda y derecha.
- Para retirar una tarea, selecciónela y utilice el icono de menos.

Integración de enlaces para una tarea

Implementation Project

Progress Plan

Select Level 4

Select Step

Configure Services

Licences

Back-up

Install Analytics Database (for B1A or B1H, if required)

Install Integration Framework (if required)

Install Outlook Integration Server (if required)

Install SAP Add-Ons (as Required)

Add-on Installation

Install Ex

Copy

Copy Table

Copy Table (ment)

Create D

Maximize/Restore Grid

Test Res

Add Link

Rename Step

Update Cancel

Menu Selection Form

Administration

Financials

Opportunities

Sales - A/R

My add-on

Sales Blanket Agreement

Sales Quotation

Sales Order

Delivery

Return

A/R Down Payment Request

A/R Down Payment Invoice

A/R Invoice

A/R Invoice + Payment

A/R Credit Memo

A/R Reserve Invoice

OK Cancel

Implementation Project

Progress Plan

Select Level 6

Select Step

Conduct Post Phase Analysis

Sign Off Project Phase with Client

Project Realisation

Configuration of SAP Business One

Company Details

General Settings

Posting Periods

My add on installation

Installation

Configuration

Document Numbering

Document Settings

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

32

- Cuando añade una nueva tarea a un plan, tiene la opción de añadir enlaces a las pantallas de configuración relacionadas. Esto resulta útil si tiene un add-on como parte de la solución; puede añadir tareas para instalarlo y proporcionar enlaces a su configuración.
- Para añadir un enlace a una tarea:
 - Primero, marque la casilla de selección de la tarea.
 - A continuación, seleccione *Añadir enlace* desde el menú contextual.
 - En el *Formulario de selección de menú*, puede seleccionar el elemento apropiado del menú desde el menú de SAP Business One.
 - Después de seleccionarlo, la flecha de enlace naranja aparece a la izquierda del nombre de la tarea.

Resumen



Puntos clave de este tema:

- Puede mejorar el éxito de un proyecto adoptando determinadas estrategias como la gestión de modificaciones, la gestión de riesgos y mejorar la experiencia de SAP y otros interlocutores.
- Una metodología de proyecto estructurada, como la metodología de implementación acelerada (AIP), es una metodología comprobada con las mejores prácticas para una implementación de SAP Business One.
- La metodología AIP divide una implementación en fases con hitos. Estas fases incluyen el período que comienza con la *transferencia por parte del equipo de ventas* hasta la *transferencia a la organización de soporte*.
- La metodología proporciona herramientas y modelos que le ayudarán con el análisis del proceso empresarial, la migración de datos, el análisis de riesgos, la gestión de cambios, la estrategia de prueba y los planes de formación.
- Los planes de proyecto integrados en el cliente SAP Business One son fáciles de usar e incluyen todas las actividades del proyecto recomendadas. Puede generar su propio plan de proyectos a partir de un modelo, o crear un plan en blanco en el sistema. Puede adjuntar documentación del proyecto compartida y registrar el tiempo y el progreso planificado y real en el plan integrado.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

33

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

- Puede mejorar el éxito de un proyecto de implementación adoptando determinadas estrategias como la gestión de modificaciones, la gestión de riesgos y mejorar la experiencia de SAP y otros interlocutores.
- La metodología de implementación acelerada (AIP) de SAP es una metodología de proyecto comprobada para las implementaciones de SAP Business One. Se basa en las experiencias prácticas de SAP y sus interlocutores.
- La metodología AIP divide una implementación en fases con hitos. Estas fases incluyen el período que comienza con la *transferencia por parte del equipo de ventas* hasta la *transferencia a la organización de soporte*:
 - Preparación del proyecto: El plan del proyecto se crea para la implementación. Se mantiene una reunión de inicio con el cliente y se entrega el software.
 - Blueprint empresarial: El objetivo consiste en analizar los procesos y requisitos empresariales del cliente y trazarlos hasta una solución.
 - Realización del proyecto: Es la parte central del proyecto, donde la empresa se configura para coincidir con el blueprint empresarial. También se realizan las pruebas.
 - Preparación final: El objetivo es la preparación para la puesta en marcha. Se define la fecha de puesta en marcha, se forma a los usuarios y se transfieren los saldos finales.
 - Puesta en marcha y soporte: Después de la puesta en marcha, el cliente pasa a modo soporte.
- La metodología proporciona mejores prácticas, herramientas y modelos que le ayudarán con el análisis del proceso empresarial, la migración de datos, el análisis de riesgos, la gestión de cambios, la estrategia de prueba y los planes de formación.
- Los planes de proyecto integrados en el cliente SAP Business One son fáciles de usar, incluyen todas las actividades del proyecto recomendadas e integran las tareas con pantallas de

configuración.

- Puede generar su propio plan de proyectos a partir de uno de los modelos, o crear un plan en blanco en el sistema. Puede adjuntar la documentación de proyecto compartida en el plan integrado y registrar el tiempo y el progreso real y planificado.
